COMUNE DI SANTA GIUSTA - COMPLETAMENTO RETE IDRICA NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO
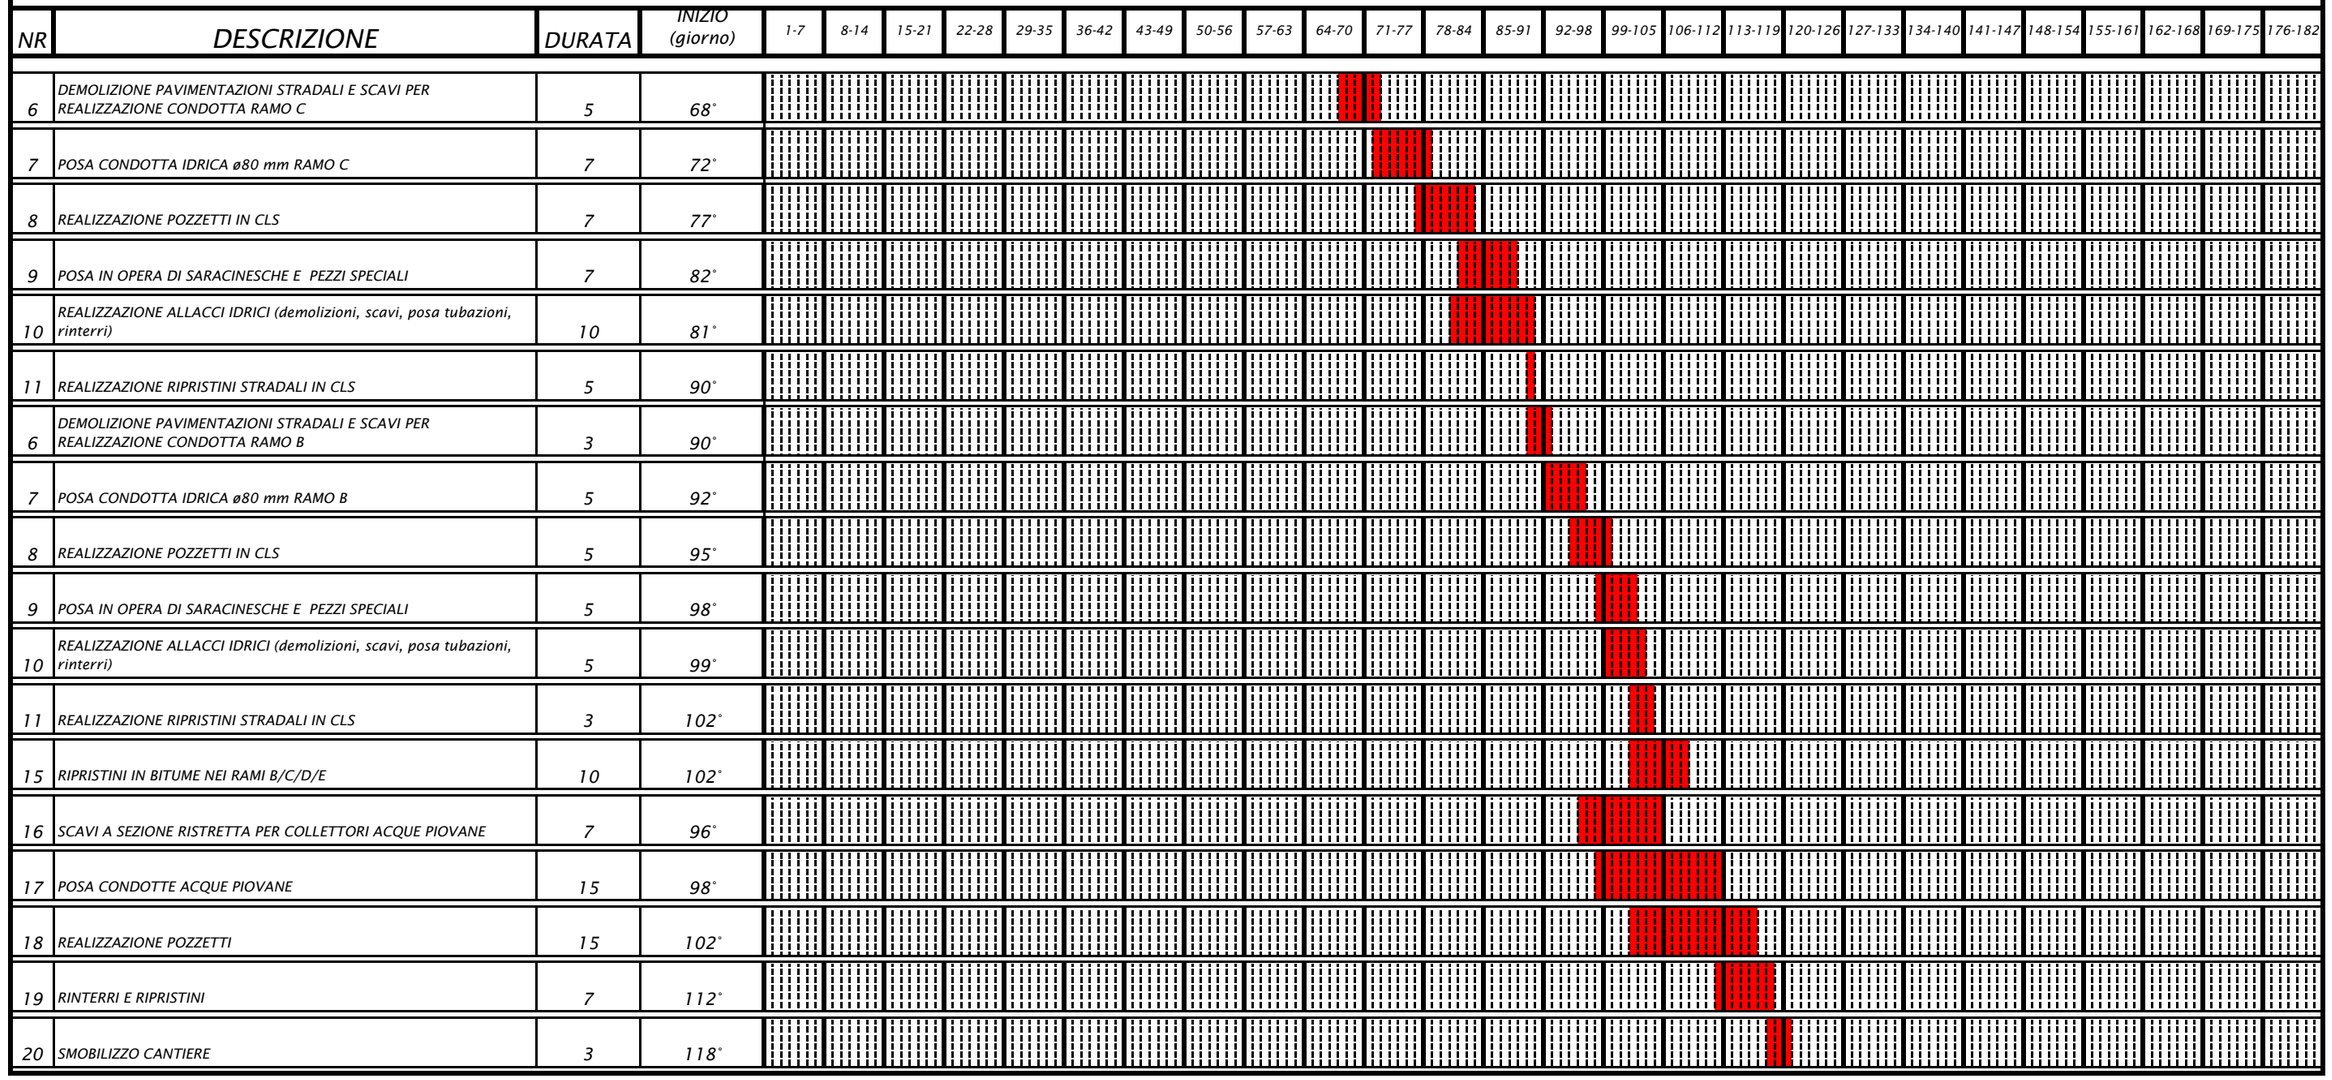
NR	DESCRIZIONE	DURATA	INIZIO (giorno)
6	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI E SCAVI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA RAMO C	5	68°
7	POSA CONDOTTA IDRICA ø80 mm RAMO C	7	72°
8	REALIZZAZIONE POZZETTI IN CLS	7	77°
9	POSA IN OPERA DI SARACINESCHE E PEZZI SPECIALI	7	82°
10	REALIZZAZIONE ALLACCI IDRICI (demolizioni, scavi, posa tubazioni, rinterri)	10	81°
11	REALIZZAZIONE RIPRISTINI STRADALI IN CLS	5	90°
6	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI E SCAVI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA RAMO B	3	90°
7	POSA CONDOTTA IDRICA ø80 mm RAMO B	5	92°
8	REALIZZAZIONE POZZETTI IN CLS	5	95°
9	POSA IN OPERA DI SARACINESCHE E PEZZI SPECIALI	5	98°
10	REALIZZAZIONE ALLACCI IDRICI (demolizioni, scavi, posa tubazioni, rinterri)	5	99°
11	REALIZZAZIONE RIPRISTINI STRADALI IN CLS	3	102°
15	RIPRISTINI IN BITUME NEI RAMI B/C/D/E	10	102°
16	SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER COLLETTORI ACQUE PIOVANE	7	96°
17	POSA CONDOTTE ACQUE PIOVANE	15	98°
18	REALIZZAZIONE POZZETTI	15	102°
19	RINTERRI E RIPRISTINI	7	112°
20	SMOBILIZZO CANTIERE	3	118°
